



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

I-000083/DMOP/16 REL_OB_2 01-03-2016

RELATÓRIO FINAL (ART.º 148.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e respectiva
ordenação das propostas admitidas.
Adjuque-se à proposta ordenada
em primeiro lugar.

2016-03-02

Assunto: Recuperação de edifícios escolares desactivados (Beneficiação e Restauração da Escola da Ilha de Baixo – Proc. n.º 05/2016)

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a apresentação de observação por parte do concorrente Martinho Pedrosa – Construções, Lda., observação essa que se anexa e que será motivo de análise por este Júri.

Realça da observação, o pedido de exclusão da proposta do concorrente Conjuntura Intensa, Lda., ordenada em primeiro lugar no Relatório Preliminar, com fundamento na “Alínea b) do n.º 2 do Art. 57.º do CCP, conjugado com o ponto 7.3 do Programa de Concurso, pelo facto de a proposta não estar assinada pelo concorrente ou por representante legal com poderes para o efeito.” e ainda, “Nº 1 e Nº 7 do Art. 361 do CCP, conjugada com o ponto 7.2 do programa de concurso, porquanto a análise da proposta revela impossibilita a sua avaliação em virtude da falta de alguns atributos nos planos de trabalhos, equipamentos, mão de obra e de pagamentos, pelo facto de estes não estarem realizados de acordo com os capítulos do mapa de quantidades, faltando-lhes os capítulos XVIII, XIX e XX.”

Vejamos então o que entendemos desta argumentação.

Quanto à “proposta não estar assinada”, manifestamos desde já total discordância, por verificarmos que todos os documentos que constituem a proposta estão devidamente assinados com certificado de assinatura electrónica qualificada, emitido por “DigitalSign Qualified CA – G2”, para Conjuntura Intensa, Lda., conforme anexo com imagem do certificado (Anexo 1).

Quanto à “...falta de alguns atributos nos planos de trabalhos, equipamentos, mão-de-obra e de pagamentos...”, entende o Júri que os capítulos 18 – Iluminação de emergência, 19 – Terra de protecção e 20 – Cabos de alimentação dos quadros, não podem ser dissociados do capítulo 17 – Rede eléctrica, pois tratam-se de trabalhos da mesma especialidade e que o concorrente reclamado juntou em um único, não sendo este facto prejudicial ao normal desenvolvimento da obra, assim como, impeditivo da fiscalização analisar os eventuais atrasos ou adiantamentos dos prazos parciais.

Em face do acima exposto entende o Júri, negar provimento ao reclamado.

2. Nestes termos, propõe-se a **exclusão** das propostas a seguir mencionadas, com os fundamentos referidos:

- Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

- Rogério Paulo da Silva Duarte, com fundamento na alínea o) do n.º 2 do Artigo 146.º, conjugada com a alínea c) do n.º 2 do artigo 70.º, ambos do CCP, por fazer constar uma memória descritiva que não corresponde ao procedimento a

**Município de Pombal****Departamento Municipal de Operações**

concurso.

3. Propõe-se ainda, em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Conjuntura Intensa, Lda., com proposta no valor de € 72.971,21, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Segunda

Martinho Pedrosa - Construções, Lda., com proposta no valor de € 74.657,70, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Terceira

Valeixa Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 77.153,10, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Quarta

Aruncalis, Lda., com proposta no valor de € 78.333,12, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Quinta

Pinto & Bras, Lda., com proposta no valor de € 79.135,61, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Sexta

Fernando Major - Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 79.600,14, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Sétima

Alvape Construção e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 83.671,15, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Oitava

Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 84.000,00, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Nona

Jorge M.F. Gaudêncio - Construção Civil, Limitada., com proposta no valor de € 87.206,30, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Décima

Nortejuvil, Sociedade de Construções Lda., com proposta no valor de € 88.777,61, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Décima Primeira

Construforte, Sociedade de Construções e Empreitadas, Limitada., com proposta no valor de € 89.080,20, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Décima Segunda

Alpeso - Construções, S.A., com proposta no valor de € 92.443,24, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

Décima Terceira

Soteol - Sociedade Terraplanagens do Oeste, Lda., com proposta no valor de € 92.900,59, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 30 dias;

Décima Quarta

F. G. Silva, Lda., com proposta no valor de € 93.982,04, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Décima Quinta

Marcelino & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 96.063,27, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Décima Sexta

Construtora Santovaiense - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 96.288,36, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

Décima Sétima

Lizconstroi - Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 96.543,05, mais IVA, com o prazo de execução de 90 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)


O Membro Efectivo,

(Nuno Alexandre Duarte da Mota – Eng.º)



MUNICÍPIO DE POMBAL
CÂMARA MUNICIPAL

Relatório Final
(Artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos)

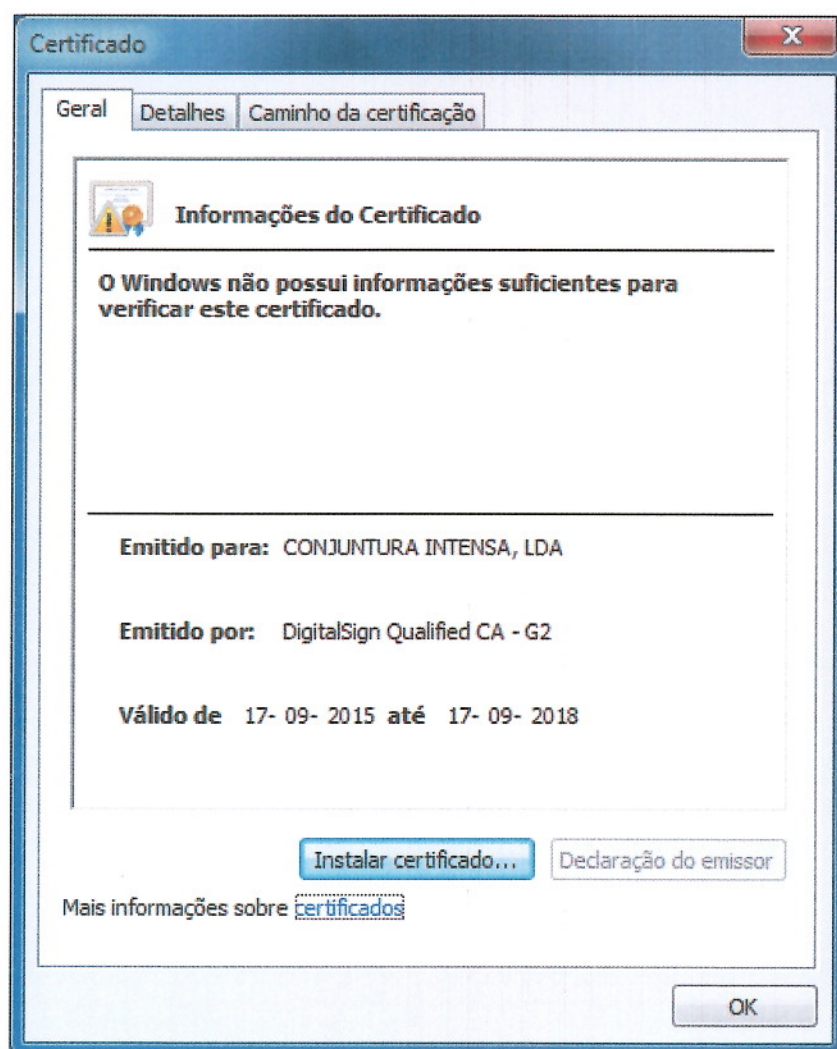

[Handwritten signature]

RESPOSTA(S) DO(S) FORNECEDOR(ES)

Referência do Procedimento:Proc. n.º 05/2016

Designação do Procedimento:Recuperação de edifícios escolares desactivados (Beneficiação e Restauração da Escola da Ilha de Baixo) - Proc. n.º 05/2016

Fornecedor:PINTO & BRAS, LDA

Sem resposta

Fornecedor:DELFIN DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA.

Sem resposta

Fornecedor:CONSTRUFORTE, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS, LIMITADA.

Sem resposta

Fornecedor:ALPESO - CONSTRUÇÕES, S.A.

Sem resposta

Fornecedor:SOTEOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA.

Sem resposta

Fornecedor:ODRAUDE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Sem resposta

Fornecedor:ALVAPE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Sem resposta

Fornecedor:CONSTRUTORA SANTOVAIENSE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.

Sem resposta

Fornecedor:MARCELINO & FILHOS, LDA.

Sem resposta

Fornecedor:VITOR M. C. ANTUNES, UNIPessoal LDA

Sem resposta

Fornecedor:NORTEJUVIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA

Sem resposta



Fornecedor:F. G. SILVA, LDA

Sem resposta

Fornecedor:VALEIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Sem resposta

Fornecedor:MARTINHO PEDROSA - CONSTRUÇÕES, LDA

Respondido em: 2016-02-22 12:05:54

Resposta: Ex.mos Srs. Serve o presente para solicitar a exclusão da proposta do concorrente "Conjuntura Intensa, Lda.", 1º classificado, com os seguintes fundamentos: 1) Alínea b) do nº2 do Art. 57.º do CCP, conjugado com o ponto 7.3 do Programa de Concurso, pelo facto de a proposta não estar assinada pelo concorrente ou por representante legal com poderes para o efeito; 2)Nº 1 e Nº 7 do Art. 361 do CCP, conjugada com o ponto 7.2 do programa de concurso, porquanto a análise da proposta revela impossibilita a sua avaliação em virtude da falta de alguns atributos nos planos de trabalhos, equipamentos, mão de obra e de pagamentos, pelo facto de estes não estarem realizados de acordo com os capítulos do mapa de quantidades, faltando-lhes os capítulos XVIII, XIX e XX. Em anexo seguem respectivos documentos do concorrente. Sem outro assunto, Cumprimentos, A empresa, Martinho Pedrosa - Construções, Lda

Documentos Anexados

- Plano_de_EQ_CMPombal__Escola_da_Ilha.pdf
- Plano_de_MO_CMPombal__Escola_da_Ilha.pdf
- Plano_de_Pagamentos_CMPombal__Escola_da_Ilha.pdf
- Programa_de_trabalhos_CMPombal__Escola_da_Ilha.pdf
CI_DECL-AnexoI_ccp_CMPombal__Escola_da_Ilha.pdf

Fornecedor:PRIMUS LEAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA

Sem resposta

Fornecedor:FERNANDO MAJOR - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA

Sem resposta

Fornecedor:ROGERIO PAULO DA SILVA DUARTE

Sem resposta

Fornecedor:ARUNCALIS, LDA.

Sem resposta

Fornecedor:CONJUNTURA INTENSA, LDA.

Sem resposta

Fornecedor:LIZCONSTROI-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Sem resposta

Fornecedor:JORGE M.F. GAUDÊNCIO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMITADA.

Sem resposta





DECLARAÇÃO

Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57º do CCP

1 - Leonel Domingues Rodrigues, portador do cartão de Cidadão n.º 12055768 5ZZ7, com validade até 26/08/2016, com morada na Travessa da Lameira, n.º 7, Lameiros, 3100-814 Vila Cã, na qualidade de representante legal da firma **Conjuntura Intensa, Lda.**, com sede na Rua Dr. José dos Santos Alves, n.º 25, 3100-480 Pombal, concelho de Pombal, pessoa colectiva n.º 510 076 963, matriculada na conservatória do registo comercial de Pombal, sob o n.º 510 076 963, com capital social de € 35.000,00, Titular do alvará de construção n.º 68426 emitido pelo INCI, I.P. tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de **“Recuperação de edifícios escolares desactivados (Beneficiação e Restauração da Escola da Ilha de Baixo.) - Proc.º N.º 05/2016.”**, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:



CONJUNTURA INTENSA LDA.
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS.

- a) Nota justificativa do preço proposto;
- b) Documento que contém os atributos da proposta;
- c) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução e respectiva folha de resumo;
- d) Documento a que alude o n.º 4 do artigo 60º do CCP;
- e) Documentos que contenham esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo;
- f) Plano de trabalhos e respectiva memória descritiva e justificativa;
- g) Plano de Mão-de-obra e plano de Equipamentos;
- h) Plano de pagamentos e Cronograma Financeiro;
- i) Declaração da não apresentação de lista de suprimentos de erros e omissões;

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:

- a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;



CONJUNTURA INTENSA LDA.
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS.

- b) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
- c) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
- d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal;
- e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
- f) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º1 do artigo 71 da lei n.º19/2012 de 8 de Maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória;
- g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 627.º do Código do Trabalho;
- h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;



CONJUNTURA INTENSA LDA.
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS.

i) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes:

- i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
- ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
- iii) Fraude, na acepção do artigo 1º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
- iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;

j) Tenham, a qualquer título, prestado, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual



CONJUNTURA INTENSA LDA.
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS.

pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.


Pombal, 15 de Fevereiro de 2016



Plano de trabalhos
(Prazo de execução 90 dias)

Conjuntura Intensa Lda

Empreitada: "Recuperação de edifícios escolares desactivados (Beneficiação e Restauração da Escola da Ilha de Baixo.) - Proc.º N.º 05/2016.

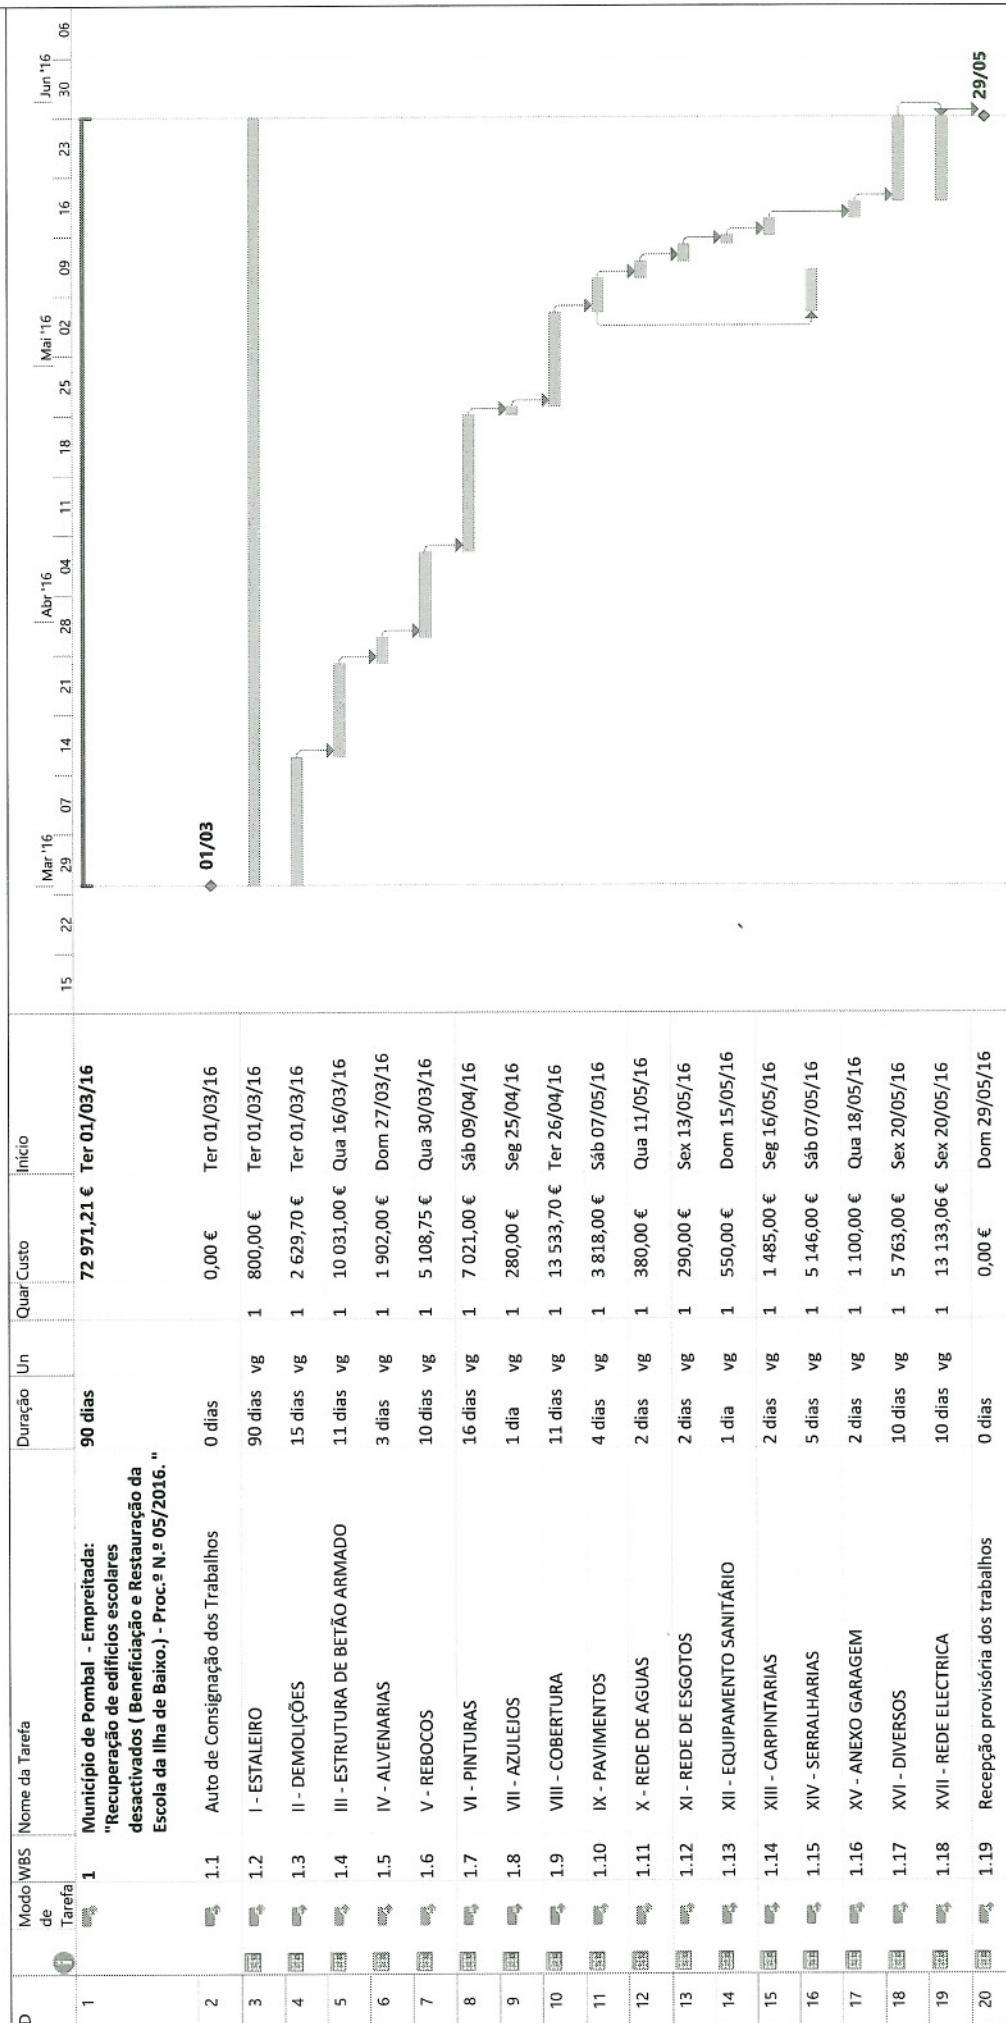

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo

Crítica

Crítica Divisão

Progresso

Progresso Manual

Página 1

Conjuntura Intensa Lda

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE ACTIVIDADE

EMPREITADA : "Recuperação de edifícios escolares desativados (Beneficiação e Restauração da Escola da Ilha de Baixo.) - Proc.º N.º 05/2016."

Prazo de Execução: 90 dias de calendário

ID	Nome da Tarefa	Custo	Imputação dos Custos Fixos	Custo Total	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	Município de Pombal - Empreitada: "Recuperação de edifícios escolares desativados"	72 971,21 €	Rateado	€72 971,21	1 105,21 €	1 289,41 €	4 972,40 €	6 167,67 €	3 884,60 €	3 494,23 €	3 133,91 €	3 133,91 €	7 724,24 €	10 181,3..	6 278,82 €	3 316,04 €	13 289,4..
3	I - ESTALEIRO	800,00 €	Rateado	€800,00	53,33 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €	62,22 €
4	II - DEMOLIÇÕES	2 629,70 €	Rateado	€2 629,70	1 051,88 €	1 227,19 €	350,63 €										
5	III - ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	10 031,00 €	Rateado	€10 031,00			4 559,55 €	5 471,45 €									
6	IV - ALVENARIAS	1 902,00 €	Rateado	€1 902,00				634,00 €	1 268,00 €								
7	V - REBOCOS	5 108,75 €	Rateado	€5 108,75					2 554,38 €	2 554,38 €							
8	VI - PINTURAS	7 021,00 €	Rateado	€7 021,00						877,63 €	3 071,69 €	3 071,69 €					
9	VII - AZULEJOS	280,00 €	Rateado	€280,00									280,00 €				
10	VIII - COBERTURA	13 533,70 €	Rateado	€13 533,70									7 382,02 €	6 151,68 €			
11	IX - PAVIMENTOS	3 818,00 €	Rateado	€3 818,00										1 909,00 €	1 909,00 €		
12	X - REDE DE AGUAS	380,00 €	Rateado	€380,00											380,00 €		
13	XI - REDE DE ESGOTOS	290,00 €	Rateado	€290,00											290,00 €		
14	XII - EQUIPAMENTO SANITÁRIO	550,00 €	Rateado	€550,00											550,00 €		
15	XIII - CARPINTARIAS	1 485,00 €	Rateado	€1 485,00												1 485,00 €	
16	XIV - SERRALHARIAS	5 146,00 €	Rateado	€5 146,00													
17	XV - ANEXO GARAGEM	1 100,00 €	Rateado	€1 100,00										2 058,40 €	3 087,60 €		
18	XVI - DIVERSOS	5 783,00 €	Rateado	€5 783,00												1 100,00 €	
19	XVII - REDE ELÉTRICA	13 133,05 €	Rateado	€13 133,05												1 728,90 €	4 034,10 €
																3 939,92 €	9 193,14 €

Coniuntura Intensa Lda

ID	Modo de	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
		Ajudantes de pintor	128 hrs		Sáb 09-04-16	Dom 24-04-16						16h	56h	56h					
9		VII - AZULEJOS	24 hrs1 dia		Seg 25-04-16	Seg 25-04-16						100%	100%	100%	24h				
		Ladrilhadores	8 hrs		Seg 25-04-16	Seg 25-04-16									8h				
		Ajudantes de ladrilhador	8 hrs		Seg 25-04-16	Seg 25-04-16									100%				
10		VIII - COBERTURA	880 hrs11 dias		Ter 26-04-16	Sex 06-05-16									100%	400h			
		Pedreiros	88 hrs		Ter 26-04-16	Sex 06-05-16									48h	40h			
		Serventes	88 hrs		Ter 26-04-16	Sex 06-05-16									100%	100%			
		Serralheiros	88 hrs		Ter 26-04-16	Sex 06-05-16									48h	100%			
11		IX - PAVIMENTOS	192 hrs4 dias		Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16									100%	100%	96h		
		Calceteiros	32 hrs		Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16										16h	16h		
		Ajudantes de ladrilhador	32 hrs		Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16										100%	100%		
		Ajudantes de carpinteiro de limpos	32 hrs		Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16										100%	100%		
12		X - REDE DE AGUAS	48 hrs2 dias		Qua 11-05-16	Qui 12-05-16											48h		
		Canalizadores	16 hrs		Qua 11-05-16	Qui 12-05-16											16h		
		Ajudantes de canalizador	16 hrs		Qua 11-05-16	Qui 12-05-16											100%		
13		XI - REDE DE ESGOTOS	48 hrs2 dias		Sex 13-05-16	Sáb 14-05-16											16h		
		Canalizadores	16 hrs		Sex 13-05-16	Sáb 14-05-16											100%		
		Ajudantes de canalizador	16 hrs		Sex 13-05-16	Sáb 14-05-16											16h		
14		XII - EQUIPAMENTO SANITÁRIO	24 hrs1 dia		Dom 15-05-16	Dom 15-05-16											24h		
		Canalizadores	8 hrs		Dom 15-05-16	Dom 15-05-16											8h		
		Ajudantes de canalizador	8 hrs		Dom 15-05-16	Dom 15-05-16											100%		
15		XIII - CARPINTARIAS	48 hrs2 dias		Seg 16-05-16	Ter 17-05-16											100%	48h	
		Carpinteiros de limpos	16 hrs		Seg 16-05-16	Ter 17-05-16													
		Ajudantes de carpinteiro de limpos	16 hrs		Seg 16-05-16	Ter 17-05-16													
16		XIV - SERRALHARIAS	160 hrs5 dias		Sáb 07-05-16	Qua 11-05-16										64h	96h		
		Serralheiros	40 hrs		Sáb 07-05-16	Qua 11-05-16										16h	24h		

Prazo de execução (90 dias)

Empreitada: "Recuperação de edifícios escolares desactivados (Beneficência e Restauração da Escola da Ilha de Baixo.) - Proc.º N.º 05/2016..

ID	Modo de	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
17		Ajudantes de serralheiro	40 hrs	Sáb 07-05-16	Qua 11-05-16											16h	24h		
		XV - ANEXO GARAGEM	64 hrs 2 dias	Qua 18-05-16	Qui 19-05-16											100%	100%	64h	
		Serralheiros	16 hrs	Qua 18-05-16	Qui 19-05-16													16h	
		Ajudantes de serralheiro	16 hrs	Qua 18-05-16	Qui 19-05-16													100%	
18		XVI - DIVERSOS	480 hrs 10 dias	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													16h	
		Serralheiros	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Ajudantes de serralheiro	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Pintores	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Ajudantes de pintor	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
19		XVII - REDE ELECTRICA	480 hrs 10 dias	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Pedreiros	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Serventes	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Electricistas	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	
		Ajudantes de electricistas	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16													100%	

CONJUNTURA INTENSA, Lda

PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA: "Recuperação de edifícios escolares desativados (Beneficência e Restauração da Escola da Ilha de Baixo.) - Proc.º N.º 05/2016."*

Prazo de Execução: 90 dias de calendário

ID	Modo de Nome da Tarefa	Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Mês 1			Mês 2			Mês 3				
1	Município de Pombal - Empreitada: "Recuperação de edifícios escolares desativados (Beneficência e Assistência Social) - 1º Lote"	Caminhão FORD Transit L 190	15.304 hrs 90 dias	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	1.008h 100%	1.176h 100%	1.376h 100%	1.392h 100%	1.048h 100%	1.032h 100%	952h 100%	1.288h 100%	1.344h 100%	1.096h 100%	1.184h 100%	1.456h 100%
3	Camião Volvo 26T basculante	Camião Volvo 26T basculante	720 hrs	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
4	I - ESTALEIRO	I - ESTALEIRO	7.200 hrs 90 dias	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Andaimas	Andaimas	720 hrs	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Camião Volvo 26T basculante	Camião Volvo 26T basculante	720 hrs	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Betoneira LISTER LIS 250l	Betoneira LISTER LIS 250l	720 hrs	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Vedações penitências	Vedações penitências	720 hrs	Ter 01-03-16	Dom 29-05-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
4	II - DEMOLIÇÕES	II - DEMOLIÇÕES	840 hrs 15 dias	Ter 01-03-16	Ter 15-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Contentores de Resíduos	Contentores de Resíduos	120 hrs	Ter 01-03-16	Ter 15-03-16	336h 100%	392h 100%	112h 100%	112h 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Equipamento ligeiro diverso	Equipamento ligeiro diverso	120 hrs	Ter 01-03-16	Ter 15-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Carro de mão	Carro de mão	120 hrs	Ter 01-03-16	Ter 15-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Marteletes eléctricos...	Marteletes eléctricos...	120 hrs	Ter 01-03-16	Ter 15-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Picadeira	Picadeira	120 hrs	Ter 01-03-16	Ter 15-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
5	III - ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	III - ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	1.056 hrs 11 dias	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Equipamento ligeiro diverso	Equipamento ligeiro diverso	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Máquina de cortar ferro	Máquina de cortar ferro	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Máquina de dobrar ferro	Máquina de dobrar ferro	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Vibradores de betão DYNAPAC AF 21	Vibradores de betão DYNAPAC AF 21	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Bomba de betão PUTZMEISTER BRH 1408	Bomba de betão PUTZMEISTER BRH 1408	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Cofragem	Cofragem	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Autobetoneira MESSERSI P3	Autobetoneira MESSERSI P3	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Camião de betão	Camião de betão	88 hrs	Qua 16-03-16	Sab 26-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
6	IV - ALVENARIAS	IV - ALVENARIAS	96 hrs 3 dias	Dom 27-03-16	Ter 29-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Equipamento ligeiro diverso	Equipamento ligeiro diverso	24 hrs	Dom 27-03-16	Ter 29-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Betoneira LISTER LIS 250l	Betoneira LISTER LIS 250l	24 hrs	Dom 27-03-16	Ter 29-03-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
7	V - REBOCOS	V - REBOCOS	400 hrs 10 dias	Qua 30-03-16	Sex 08-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Equipamento ligeiro diverso	Equipamento ligeiro diverso	80 hrs	Qua 30-03-16	Sex 08-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Carro de mão	Carro de mão	80 hrs	Qua 30-03-16	Sex 08-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Betoneira LISTER LIS 250l	Betoneira LISTER LIS 250l	80 hrs	Qua 30-03-16	Sex 08-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
8	VI - PINTURAS	VI - PINTURAS	384 hrs 16 dias	Sáb 09-04-16	Dom 24-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Equipamento diverso de pintura	Equipamento diverso de pintura	128 hrs	Sáb 09-04-16	Dom 24-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
9	VII - AZULEJOS	VII - AZULEJOS	24 hrs 1 dia	Seg 25-04-16	Seg 25-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%
	Equipamento diverso de ladrilhador	Equipamento diverso de ladrilhador	8 hrs	Seg 25-04-16	Seg 25-04-16	48h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%	56h 100%

CONJUNTURA INTENSA, Lda

PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA: "Recuperação de edifícios escolares desativados (Beneficiário e Restauração da Escola da Ilha de Baixo.) - Proc.º N.º 05/2016."

Prazo de Execução: 90 dias de calendário

ID	Modo de Nome da Tarefa	Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Mês 1	Mês 2	Mês 3
10	VIII - COBERTURA	Rebabitadora	880 hrs 11 dias	Ter 26-04-16	Sex 06-05-16				
		Equipamento de segurança individual	88 hrs	Ter 26-04-16	Sex 06-05-16	480h 100%	40h 100%	40h 100%	40h 100%
		Berbequins	88 hrs	Ter 26-04-16	Sex 06-05-16	480h 100%	40h 100%	40h 100%	40h 100%
		Equipamento de segurança colectiva	88 hrs	Ter 26-04-16	Sex 06-05-16	480h 100%	40h 100%	40h 100%	40h 100%
11	IX - PAVIMENTOS		192 hrs 4 dias	Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16				
		Equipamento diverso de ladrilhador	32 hrs	Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16	96h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
		Equipamento diverso de carpinteiro	32 hrs	Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16	100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
		Equipamento diverso de cabeleiros	32 hrs	Sáb 07-05-16	Ter 10-05-16	100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
12	X - REDE DE AGUAS		48 hrs 2 dias	Qua 11-05-16	Qui 12-05-16				
		Equipamento diverso de canalizador	16 hrs	Qua 11-05-16	Qui 12-05-16	48h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
13	XI - REDE DE ESGOTOS		48 hrs 2 dias	Sex 13-05-16	Sáb 14-05-16				
		Equipamento diverso de canalizador	16 hrs	Sex 13-05-16	Sáb 14-05-16	48h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
14	XII - EQUIPAMENTO SANITÁRIO		24 hrs 1 dia	Dom 15-05-16	Dom 15-05-16				
		Equipamento diverso de canalizador	8 hrs	Dom 15-05-16	Dom 15-05-16	24h 100%	8h 100%	8h 100%	8h 100%
15	XIII - CARPINTARIAS		48 hrs 2 dias	Seg 16-05-16	Ter 17-05-16				
		Equipamento diverso de carpintaria	16 hrs	Seg 16-05-16	Ter 17-05-16	48h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
16	XIV - SERRALHARIAS		160 hrs 5 dias	Sáb 07-05-16	Qua 11-05-16				
		Berbequins	40 hrs	Sáb 07-05-16	Qua 11-05-16	64h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
		Equipamento diverso de serralharia	40 hrs	Sáb 07-05-16	Qua 11-05-16	64h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
17	XV - ANEXO GARAGEM		64 hrs 2 dias	Qua 18-05-16	Qui 19-05-16				
		Berbequins	16 hrs	Qua 18-05-16	Qui 19-05-16	64h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
		Equipamento diverso de serralharia	16 hrs	Qua 18-05-16	Qui 19-05-16	64h 100%	16h 100%	16h 100%	16h 100%
18	XVI - DIVERSOS		480 hrs 10 dias	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16				
		Equipamento diverso de pintura	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16	144h 100%	24h 100%	24h 100%	24h 100%
		Equipamento diverso de serralharia	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16	144h 100%	24h 100%	24h 100%	24h 100%
19	XVII - REDE ELECTRICA		480 hrs 10 dias	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16				
		Equipamento ligeiro diverso	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16	144h 100%	24h 100%	24h 100%	24h 100%
		Equipamento diverso de electricista	80 hrs	Sex 20-05-16	Dom 29-05-16	144h 100%	24h 100%	24h 100%	24h 100%
